

FELIX

Framework para estruturação de soluções e integração de experiências

Agenda

- 1 Introdução**
O que é o framework
- 2 Objetivo**
Como utilizar o framework no cotidiano
- 3 O Framework**
Apresentação geral das fases
- 4 As Fases**
Como implementar as fases nos processos diários
- 5 Métricas**
Proposta de avaliação das métricas nos projetos do banco
- 6 Próximos Passos**
Próximos Passos

INTRODUÇÃO

FELIX

O Framework FELIX oferece uma metodologia clara e estratégica que capacita os POs a atuarem de forma mais ativa na definição da arquitetura da solução. Seu objetivo é garantir maior previsibilidade, alinhamento entre as equipes e mitigação de riscos desde as etapas iniciais do projeto.

Ao **padronizar os processos diários**, propõe-se consistência nas entregas e facilita a comunicação entre as equipes. Ele também centraliza os registros dos projetos em um **único ambiente**, permitindo uma visão mais clara e organizada do que está sendo desenvolvido. Além disso, assegura que todos os envolvidos compartilhem o mesmo nível de compreensão, o que reduz ruídos e aumenta a eficiência.



Objetivos

01

Garantir maior previsibilidade e mitigação de riscos desde as etapas iniciais do projeto, permitindo que os Product Owners atuem estrategicamente na definição da arquitetura da solução.


02

Promover o alinhamento e a comunicação eficiente entre as equipes por meio da padronização dos processos diários e da centralização dos registros dos projetos.

03

Assegurar um entendimento comum entre todos os envolvidos no projeto, reduzindo ruídos e aumentando a eficiência na entrega das soluções.

Framework

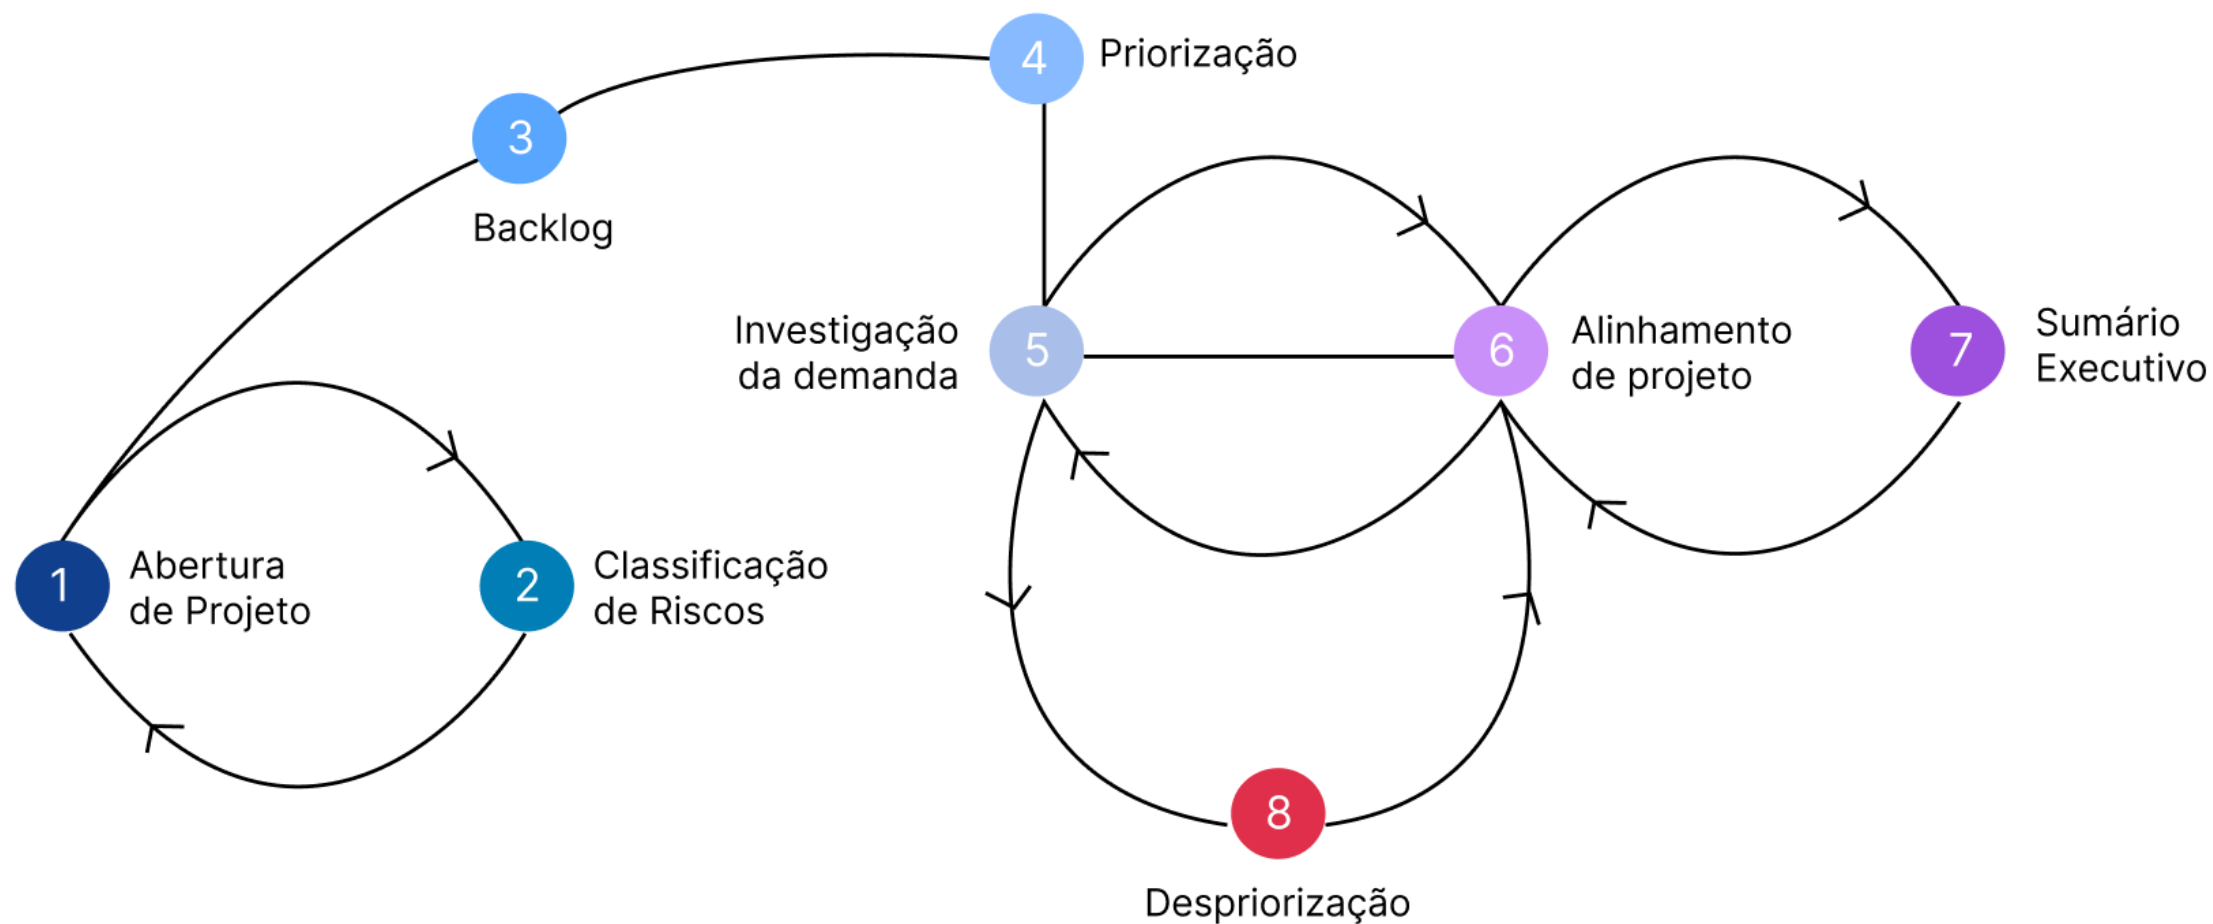

Etapas - Framework

Abertura de Projeto

Criação e formalização da solicitação do Documento de Iniciação do Projeto, contendo informações como Ganho de Eficiência em Horas, Risco Regulatório e Risco Operacional.

Classificação de Risco

Categorização das demandas por classificação (Ganho de Eficiência em Horas, Risco Regulatório e Risco Operacional), com foco em impacto e urgência.

Backlog

Organização de todas as demandas recebidas em um backlog preliminar, sem grandes critérios de priorização, servindo como repositório inicial de oportunidades.

Priorização

Definição de quais projetos ou demandas passarão pelo ciclo de maturação com base em valor, viabilidade operacional e alinhamento estratégico.

Investigação Demanda

Agendamento de reuniões com o solicitante para detalhamento e validação das regras de negócio, objetivos e requisitos do problema.

Alinhamento do Projeto

Reunião entre o PO, Tech Lead e o solicitante para mapeamento de dependências do projeto e discussão de prioridades.

Sumário Executivo

Registro do status atual e próximos passos em formato padronizado (template + e-mail), garantindo transparência com os solicitantes.

Despriorização

Reavaliação de demandas previamente priorizadas que, por mudanças de contexto, valor ou viabilidade, devem ser pausadas, reclassificadas ou removidas do ciclo de maturação.

1º Abertura de projeto

Furlan Giovanna ?



Abertura de novas demandas

Este formulário tem como objetivo registrar e formalizar novas solicitações de demandas junto à equipe responsável. Ele deve ser preenchido sempre que houver a necessidade de iniciar um novo projeto, tarefa, melhoria ou solicitação de serviço que requeira análise, priorização e acompanhamento.

Solicitante *

Nome do Projeto *

0/255

Nome da Área *

Nome do canal *

Quarter desejado *

Resumo do Problema *

0/2000

Descrição da demanda *

0/2000

Data Solicitação

UX *

APP *

Tipo de demanda *

Driver de Negócios *

Risco *

Classificação do Risco



<https://forms.monday.com/forms/3f125baead4f37aa65fcb973e3567458?r=use1>

2º Classificação dos Riscos

Classificação dos riscos

Financeiro

Nível	Comentário
BAIXO	Considerado de baixo risco quando o valor financeiro é inferior a R\$100.000
MÉDIO	Considerado de risco médio quando o valor financeiro está entre R\$100.000 e R\$400.000
ALTO	Considerado de alto risco quando o valor financeiro ultrapassa R\$400.000

Operacional

Nível	Comentário
BAIXO	Erro ou indisponibilidade do processo gera leve impacto nos processos do negócio, sem impactar os objetivos da área
MÉDIO	Erro ou indisponibilidade do processo gera retrabalho, impactando uma ou mais áreas. Impacto moderado no cronograma de trabalho, gerando remanejamento para normalização do fluxo
ALTO	Erro ou indisponibilidade do processo gera retrabalho, com alto investimento de horas, impactando uma ou mais áreas. Atraso significativo na execução das tarefas por acúmulo de trabalho. Situação deve ser formalizada ou terceiros acionados para normalizar o fluxo

Legal/Regulatório

Nível	Comentário
BAIXO	Sem impacto regulatório ou ação de órgão regulador. Quebra de contrato sem custo
MÉDIO	Ação informal de órgão regulador, sem advertência ou procedimento de supervisão. Quebra de contrato com algum custo ou censura
ALTO	Órgão regulador emite advertências formais, com possíveis multas e medidas punitivas. Quebra de contrato com possibilidade de litígio importante, multas ou censura

Reputacional

Nível	Comentário
BAIXO	Falhas isoladas restritas a funcionários do Banco. Possibilidade remota de ação judicial e contingência financeira
MÉDIO	Cobertura negativa na mídia local, afetando pequena parte da base de clientes. Possibilidade de ação judicial e contingência financeira possível
ALTO	Cobertura negativa na mídia nacional, afetando parte da base de clientes. Possibilidade de ação judicial e contingência financeira possível



<https://wiki.quickfin.com.br/en/Gestao/TmeRosa/ClassificacaoDosRiscos>

3º Backlog

PME

Descubra a IA Integrar Automatizar Convidar / 3

Quadro principal Vitória Giovanna Cintia Karla Ana Rafaela Relatório Semanal Abertura de Projeto Template Refinamento

Criar elemento Pesquisar Pessoa Filtro / 1 Ordenar Ocultar Agrupar por

Demandas

	Elemento		Solicitante	Data Solicitação	Resumo do Problema	Descrição da demanda	Quarter	Quarter desejado	Prioridade	Status Discovery	Status
☐	Integração com Carteiras Digitais (Apple Pay, Google Pay, etc.)		Pedro Esteves	ago 20	Dificuldade em usar o saldo d...	Conexão fácil e segura com...	Q3	Q3		Backlog	Backlog
☐	Emissão de Boletos de Cobrança para Pequenos Negócios		Rodrigo Dias	set 8	Pequenos empreendedores p...	Ferramenta para gerar bolet...	Q3	Q4		Backlog	Backlog
☐	Solução de Pagamento por Aproximação (NFC)		Marcelly Oliveira	jul 14	Pagamentos com cartão físic...	Tecnologia para pagar utiliz...	Q3	New		Backlog	Backlog
☐	Possibilidade de Criar Grupos para Rateio de Contas		Pedro Esteves	set 1	Dividir contas entre amigos o...	Funcionalidade para criar gr...	Q3	New		Backlog	Backlog
☐	Integração com Plataformas de Educação Financeira		Marcelly Oliveira	jul 21	Falta de acesso a recursos pa...	Links e ferramentas integra...	Q3	Priorizar		Backlog	Backlog
☐	Opção de Feedback e Avaliação de Serviços do Banco Direto no Aplic...		Marcelly Oliveira	ago 4	Dificuldade em dar feedback ...	Canal direto no aplicativo p...	Q3	Priorizar		Backlog	Backlog
☐	+ Adicionar elemento										
				jul 14 - set 8					0 Total		



https://btgpactualvol.monday.com/boards/9146650724/views/194720070

4º Priorização

Durante a fase de priorização, o time de negócios assume a responsabilidade de **revisar todas as demandas listadas no backlog**. Essa análise tem como objetivo **identificar e selecionar**, com base na relevância estratégica, no impacto para o negócio e na viabilidade de execução, **quais iniciativas devem ser priorizadas para desenvolvimento pelo time de TI**.



5º Investigação da demanda

[Refinamento] Demanda X

Campo	Descrição
Nome do Projeto	
Descrição do Problema	
Descrição da Solução	
Sistemas Utilizados	
Times Envolvidos	

Preencha as informações necessárias da demanda nesta fase de refinamento utilizando os tópicos listados abaixo. Lembre-se de excluir os itens guias após preenchê-los.

Overview

No panorama geral precisamos destacar sobre o contexto da demanda.

O responsável pela elaboração da especificação deverá desenvolver um texto introdutório que transmita sobre o se trata a demanda, compreender as tarefas que os usuários realizam, além de procurar entender como eles usariam um novo sistema para ajudar na realização dessas tarefas.

Destaques

- Destacar as principais informações.
- Destacar as principais oportunidades.

Pontos de atenção

- Destacar os principais pontos de atenção.

!/? Riscos e Problemas

- Destacar os principais riscos que a demanda pode gerar.
- Destacar os principais problemas encontrados na durante a especificação/desenvolvimento do projeto.

Regras de Negócios

Durante o levantamento das informações, será necessário saber sobre o domínio e as regras do negócio, quais atividades devem ser envolvidas, os serviços, as ferramentas, as características da aplicação que eles desejam, assim como o desempenho esperado.

Fluxograma

Além da breve descrição, será necessário desenvolver um desenho do fluxo atual realizado pela solicitante, incluindo tarefas que são realizadas, sistemas envolvidos, recebimento de informações, etc...

Observação: Após finalizar o protótipo do fluxograma, repassar com o solicitante designado pela demanda para eventuais ponderações, correções, etc.

Etapas

Criar bullet points do faseamento das entregas.

Integrações de sistemas


Integração dos sistemas internos e externos relacionados ao projeto.



<https://wiki.quickfin.com.br/en/Gestao/TimeRosa/FELIX>

6º Alinhamento do Projeto

O principal objetivo é reunir o **time de negócios e os tech leaders** para revisar a **documentação inicial de refinamento elaborada pelo Product Owner (PO)**. Essa etapa visa avaliar a viabilidade técnica e funcional da demanda, validar os requisitos propostos e complementar as informações necessárias. Além disso, é nesse momento que ocorre o **envolvimento de outros times** que terão participação direta ou indireta na execução do projeto, **garantindo a antecipação de possíveis dependências ou riscos**.

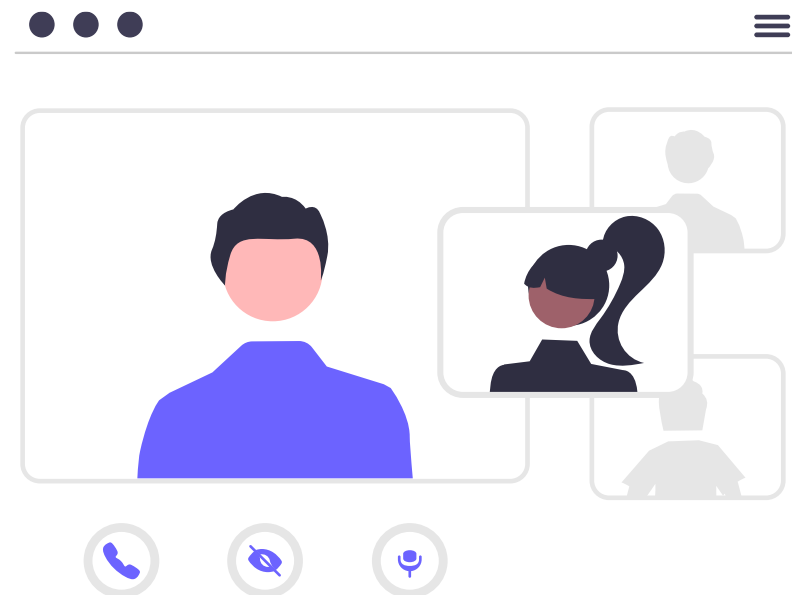

7º Sumário Executivo | Parte I

STATUS REPORT

Acompanhamento dos Projetos

Total

5

Em Progresso

1

Homologação

0

Bloqueados

0

Concluídos

0

Projetos em "Progresso" e "Concluídos"

PME

work management

IT BTG Empresas

< Demandas

Elemento		Nome da Área	Nome do canal	Timeline	Status	Data PROD	Eficiência (h/mês)	+
Transferências Inteligentes com Agendamento Resilível	🔒	Investimentos	Tragem	⏸	Em Andamento			
Pagamento de Contas Simplificado com Leitura de Código de Barras Automática	🔒	Investimentos	Tragem	⏸	Refinamento			
Bloqueio e Desbloqueio Temporário do Cartão pelo Aplicativo	🔒	Investimentos	Gerar	⏸	Aguardando Subida			
Personalização do Layout do Aplicativo com Temas e Cores	🔒	Investimentos	Digital	⏸	Refinamento			
Simulador de Financiamentos e Empréstimos Detalhado	🔒	Investimentos	Digital	⏸	Refinamento			
+ Adicionar elemento							0 Total	

Destaques

Motivos de Bloqueio



<https://btgpactualvol.monday.com/boards/9146650724/views/194720070>

7º Sumário Executivo | Parte II

STATUS REPORT

Projetos em Discovery

Aprovados

2

Refinados

2

Refinando

1

Bloqueados

0

PME

work management

IT BTG Empresas

< Demandas

Elemento		Nome da Área	Nome do canal	Prioridade	Status Discovery	Risco	Classificação do Risco	Eficiência (h/mê)
Transferências Inteligentes com Agendamento Flexível		Investimentos	Tragem		Aprovado	Operacional	0 - N/A	
Pagamento de Contas Simplificado com Leitura de Código de Barras Automática		Investimentos	Tragem		Refinado	Financeiro	3 - Alto	
Bloqueio e Desbloqueio Temporário do Cartão pelo Aplicativo		Investimentos	Geral		Aprovado	Legal / Regulatório	1 - Baixo	
Personalização do Layout do Aplicativo com Temas e Cores		Investimentos	Digital		Refinado	Financeiro	2 - Médio	
Simulador de Financiamentos e Empréstimos Detalhado		Investimentos	Digital		Refinado	Financeiro	2 - Médio	
+ Adicionar elemento				0 Total				0 Total

Destaques

Motivos de Bloqueio



<https://btgpactualvol.monday.com/boards/9146650724/views/194720070>

8º Despriorização

A fase de despriorização está conectada a todas as etapas do framework, pois pode ocorrer em qualquer momento do ciclo de vida do projeto. Nessa fase, o time de negócios pode decidir pela **retirada de uma demanda do pipeline de execução**, com base em diversos fatores. Entre os motivos mais comuns para a despriorização estão: mudanças nas estratégias da empresa, restrições orçamentárias, identificação de **iniciativas com maior impacto ou urgência**, dependências externas não resolvidas, ou até mesmo a constatação de que a solução proposta já não atende às necessidades do negócio.



Métricas

01

Tempo desde a entrada da demanda no "backlog" até estar pronta para desenvolvimento "Pronta para dev".

02

Avaliação por meio de entrevistas com desenvolvedores e stakeholders sobre os refinamentos e uso do framework.

03

Número de tarefas que, após terem sido priorizadas e iniciadas no fluxo de trabalho, foram despriorizadas e devolvidas ao Backlog.



Próximos Passos

