

FELIX

INTRODUÇÃO

Discovery

Pesquisa realizada anonimamente entre POs e Tech Leads, durante os dias 17/03 - 28/03, tendo ao todo 12 respondentes.

01

Demandas são solicitadas em diferentes canais, exigindo triagem e priorização pelo PO

02


Detalhamento inicial raso das demandas solicitadas.

03

Falta de alinhamento nas integrações e dependências entre os times envolvidos.

04

Alinhamentos adicionais pela falta de padronização nas documentações.

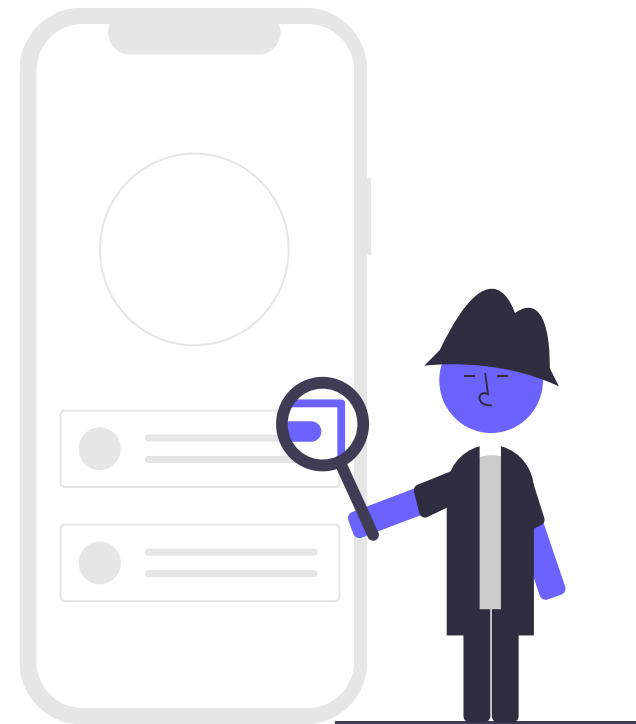


INTRODUÇÃO

Problemática

Demandas solicitadas de forma não estruturada por e-mail, Teams ou reuniões.

Resultando em:

- ❖ Perda de informações importantes;
- ❖ Processo de refinamento pouco estruturados;
- ❖ Falta de visibilidade e previsibilidade;
- ❖ Divergência na compreensão do problema entre os envolvidos; e
- ❖ Probabilidade de retrabalho;

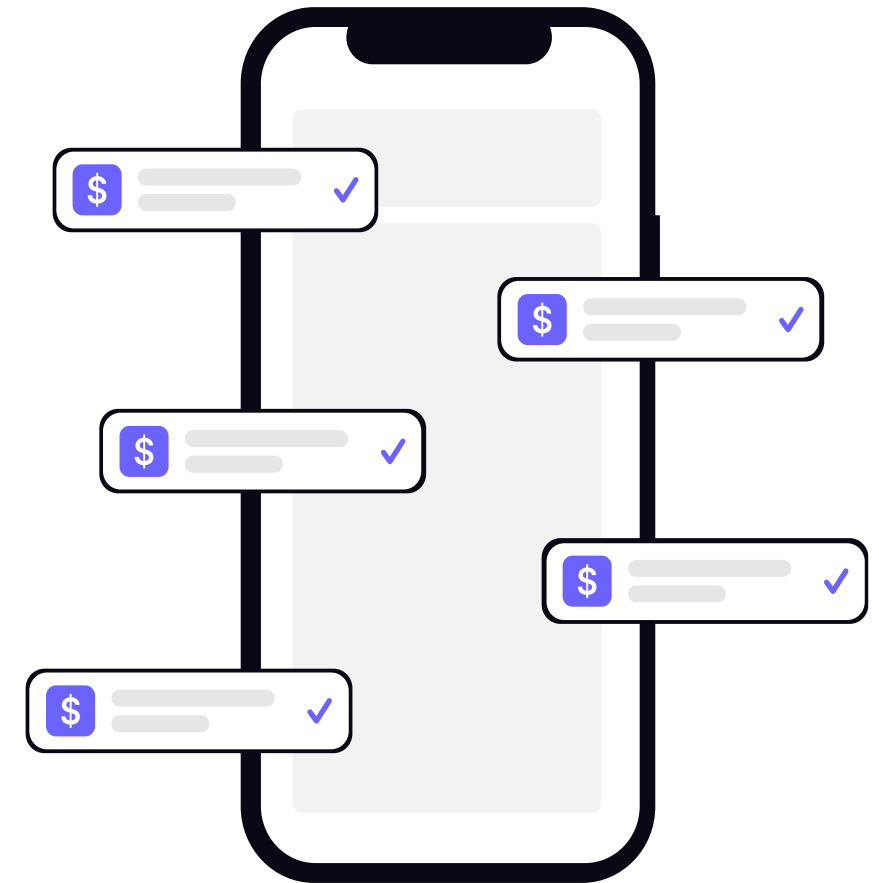

O FRAMEWORK

FELIX

Propõe um novo processo de refinamento de demandas para padronizar, alinhar equipes e reduzir riscos desde o início dos projetos.

OBJETIVOS


- Padronizar os processos diários, promovendo consistência nas entregas;
- Facilitar a comunicação entre os times, reduzindo ruídos;
- Centralizar os registros dos projetos em um único ambiente;

BASE DE CONHECIMENTO


- Metodologias Ágeis
- Desenvolvimento de Software



FELIX

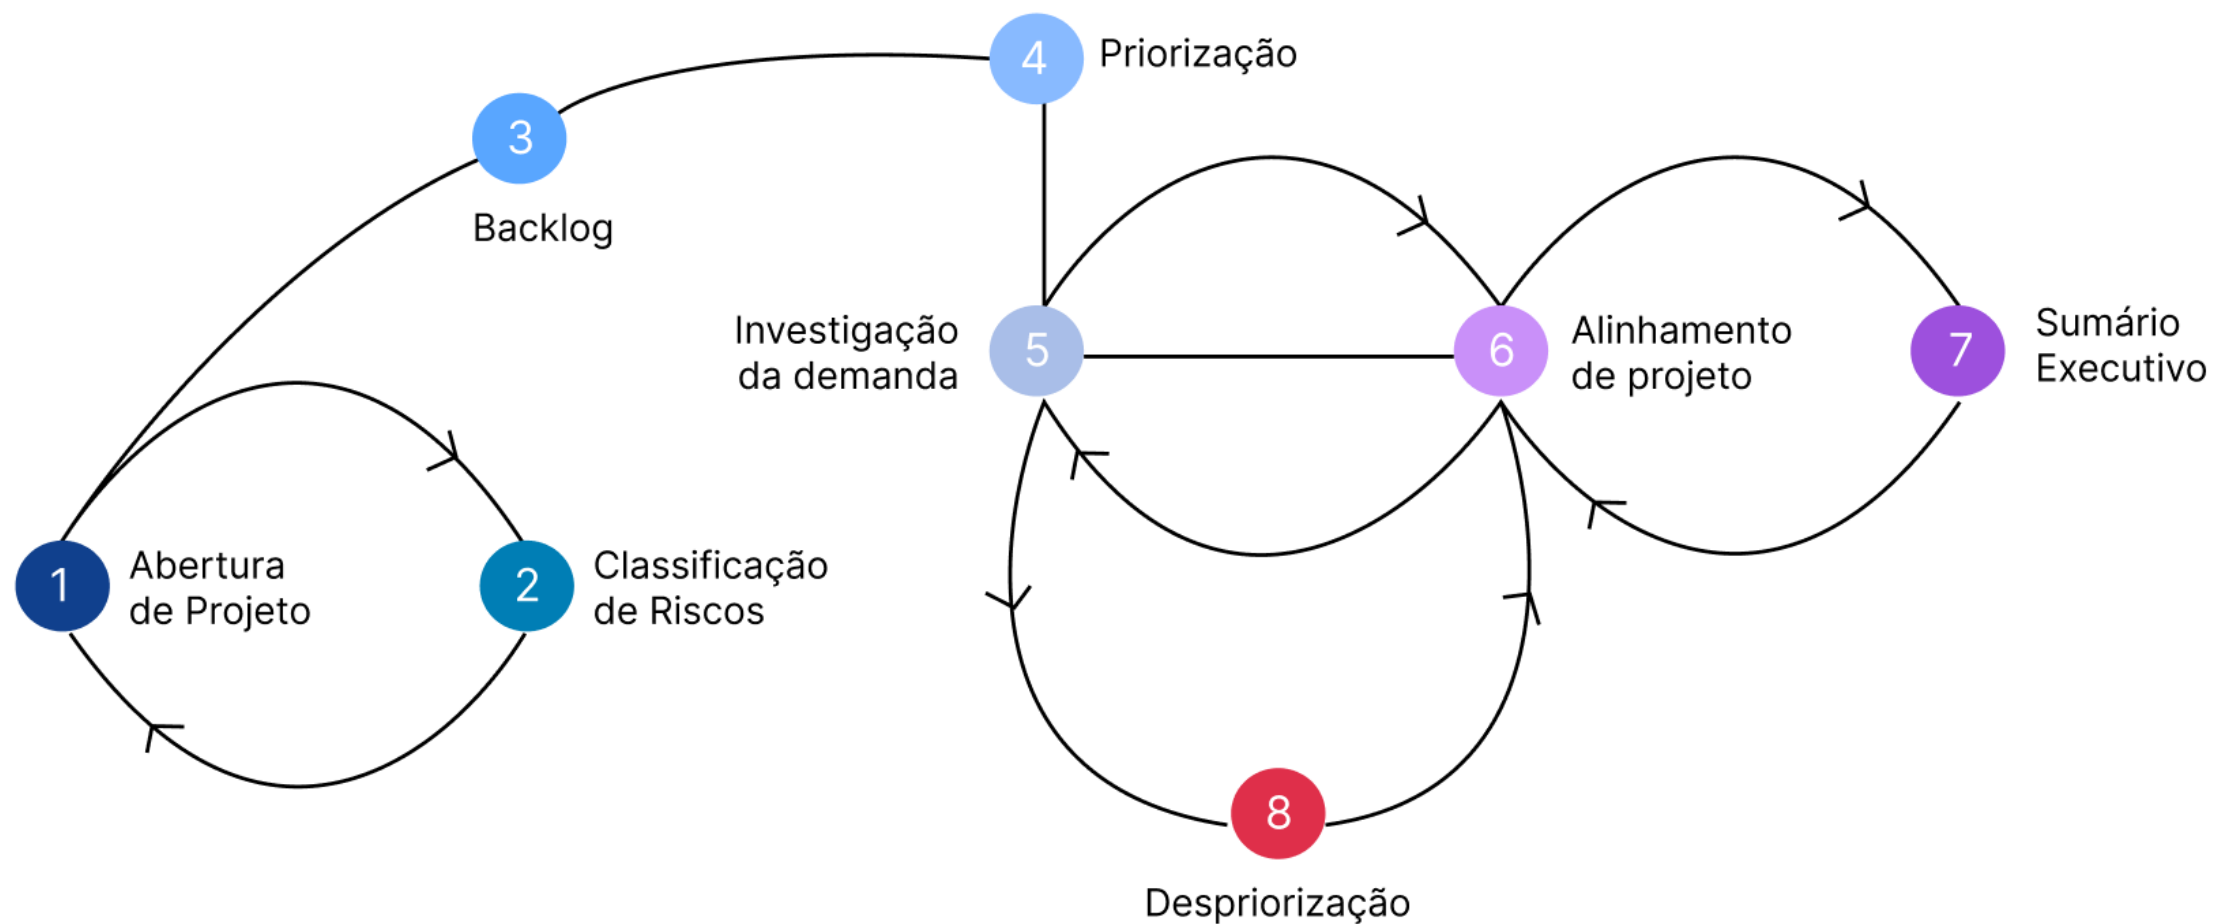

Fluxo de processo

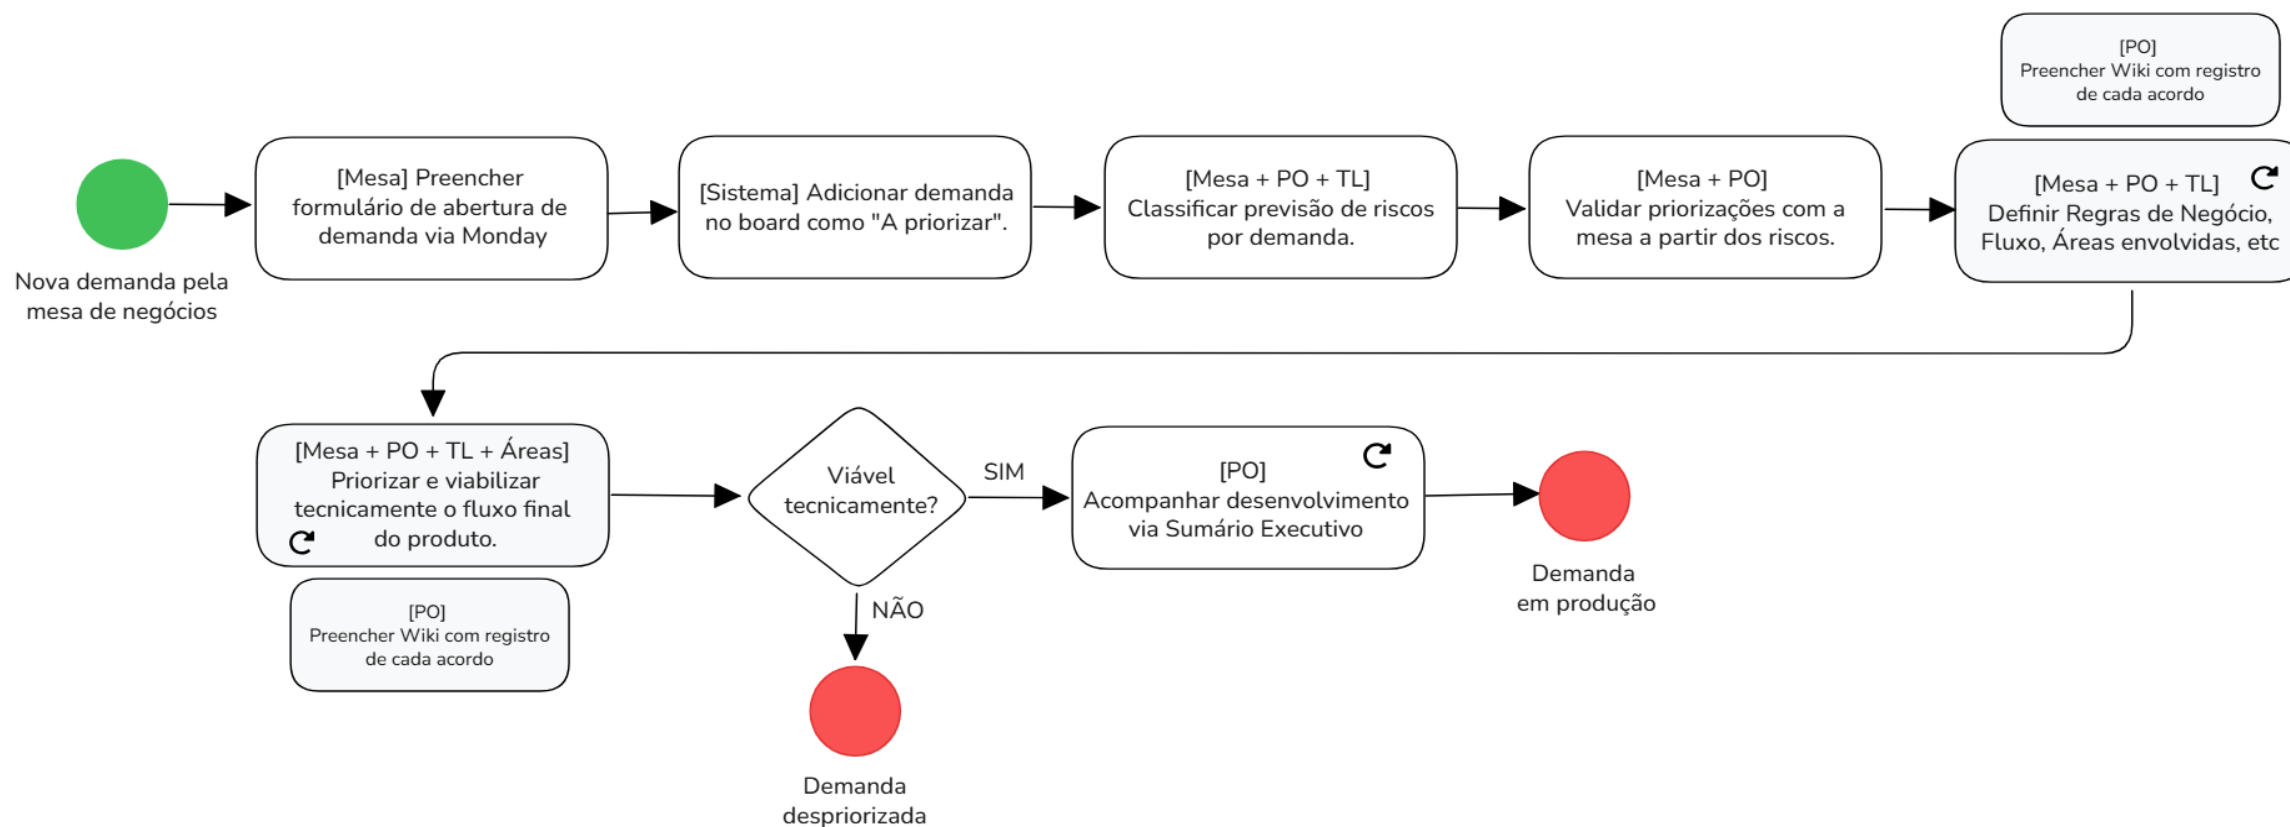

i A escolha da Wiki e Monday se deu por já serem ferramentas utilizadas pelo banco, o que facilita a adoção e minimiza a transição.

FRAMEWORK

Aplicação

PROJETOS PILOTOS

- Tomador de Crédito - Solar;
- Liquidação automática de Ordens (Google, Tiktok, etc);
- Remanejamento de Limite;
- Cedente Completo – Risco Sacado;

CASE PRINCIPAL

Liquidação automática de Ordens (Google, Tiktok, etc);



FRAMEWORK

Métricas

A análise comparou o tempo de refinamento entre projetos similares, com mesmas frentes, antes e depois do framework.

Considerados apenas os dias corridos até a conclusão, sem levar em conta possíveis imprevistos.

Modelo	Período de Análise	Média de Duração	Redução
Antes do FELIX	Registros (2024 - início de 2025)	53 dias	-
Com o FELIX	Projetos Piloto 2025	24,3 dias	↓ 54%

 Para projetos de outras áreas ou com diferentes níveis de complexidade, os resultados devem ser ajustados à realidade específica.

Análise de Dados

A pesquisa foi realizada anonimamente durante os dias 22/09 - 24/09.

6 RESPONDENTES

01

A pesquisa envolveu participantes de diferentes áreas (mesa de negócios, tech leads e POs).

02

Todos os participantes relataram maior clareza, menos retrabalho e melhor integração entre áreas.

03

Houve 100% de aprovação do padrão criado para a documentação.

04

A maioria notou redução no tempo de refinamento e aumento significativo na transparência do fluxo.



100% dos entrevistados recomendariam o uso do FELIX em outros projetos

01

Expandir solução para atender reports executivos

02

Centralizar a documentação em um único chat ou canal.



Próximos Passos

Reports Executivos - Visão Estratégica

PROVA DE CONCEITO

Reports Executivos


Implementação de reports executivos para consolidar e organizar os dados do FELIX, automatizando relatórios e ampliando a visibilidade estratégica dos projetos.

- Report mensal
- Próximas Entregas
- Visão anual

RESULTADOS ESPERADOS

Automação e visibilidade de entregas e novos projetos.

i Ferramentas avaliadas: Power BI e Monday (WorkDocs)

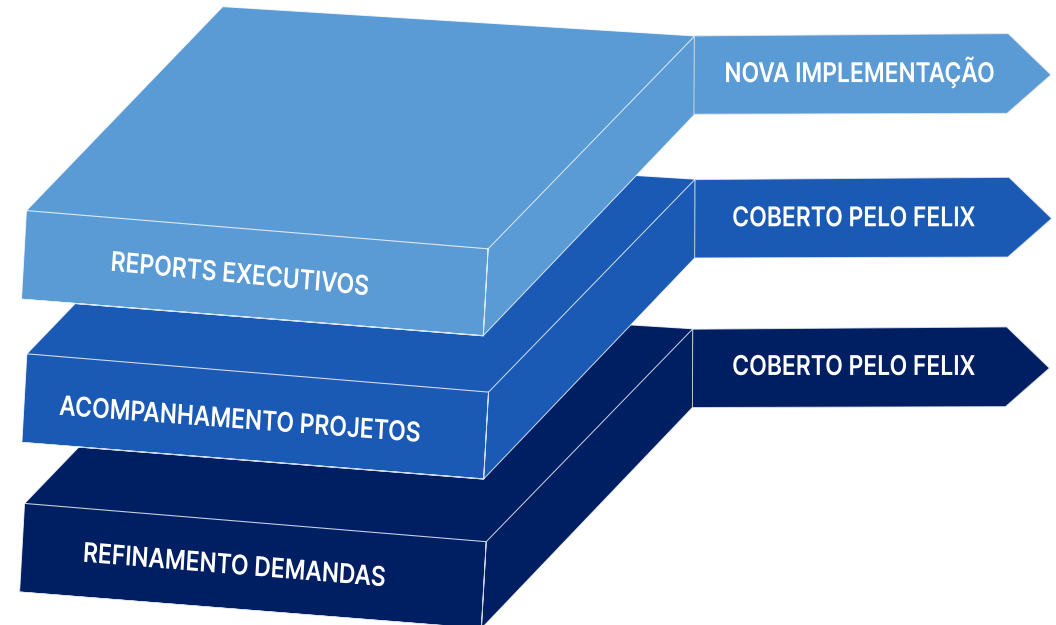



Demo | Projeto

Monday | Wiki

